

Programmstatusbericht Q4/2009

Unternehmensserviceportal

Autor: Erich Forsthuber
Dienststelle: BMF V/5
Status: freigegeben
Version: 1.0
Ort, Datum: Wien, 26.01.2010

Statusblatt des Dokuments

Dokumentverantwortlicher	Hr. DI Forsthuber Hr. Mag. Mungenast Hr. Mag. Müller
Dateiname des Dokuments	USP PRG STUFE 1 STATUS Q4 2009 V1.0 20100126.doc
Elektronische Ablage	eOffice\30 Programmsteuerung\02 Berichte
Status des Dokuments	Entwurf

Identifikation des Programms

Bezeichnung

Unternehmensserviceportal (USP)

Projekte des Programms

- Portal, Rechteverwaltung und Verfahrenseinbindung (PRV)
- Informations- und Content Aufbereitung (ICA)
- Unternehmensdatenbank (UDB)
- Informationsverpflichtungsdatenbank (IVP)
- Betriebsorganisation und Anwendersupport (BOA)

Programmstarttermin

29.04.2009

Programmendtermin

31.12.2012

Berichtszeitraum

01.10. bis 31.12.2009

Bericht erstellt von




DI Erich Forsthuber

Telefon/E-Mail



erich.forsthuber@bmf.gv.at

Gesamtstatus




Termine

-  im Plan (grün)
-  geringe Abweichung (gelb)
-  kritisch (rot)

Personal


-  Auslangen mit bestehenden Personalressourcen (grün)
-  zusätzlich benötigte Personalressourcen (rot)

Kosten

-  im Plan (grün)
-  geringe Abweichung (gelb)
-  Mehraufwand (rot)

Programmfortschritt

Die Programmkoordination und das Controlling erfolgt anhand der Struktur des Masterplans.

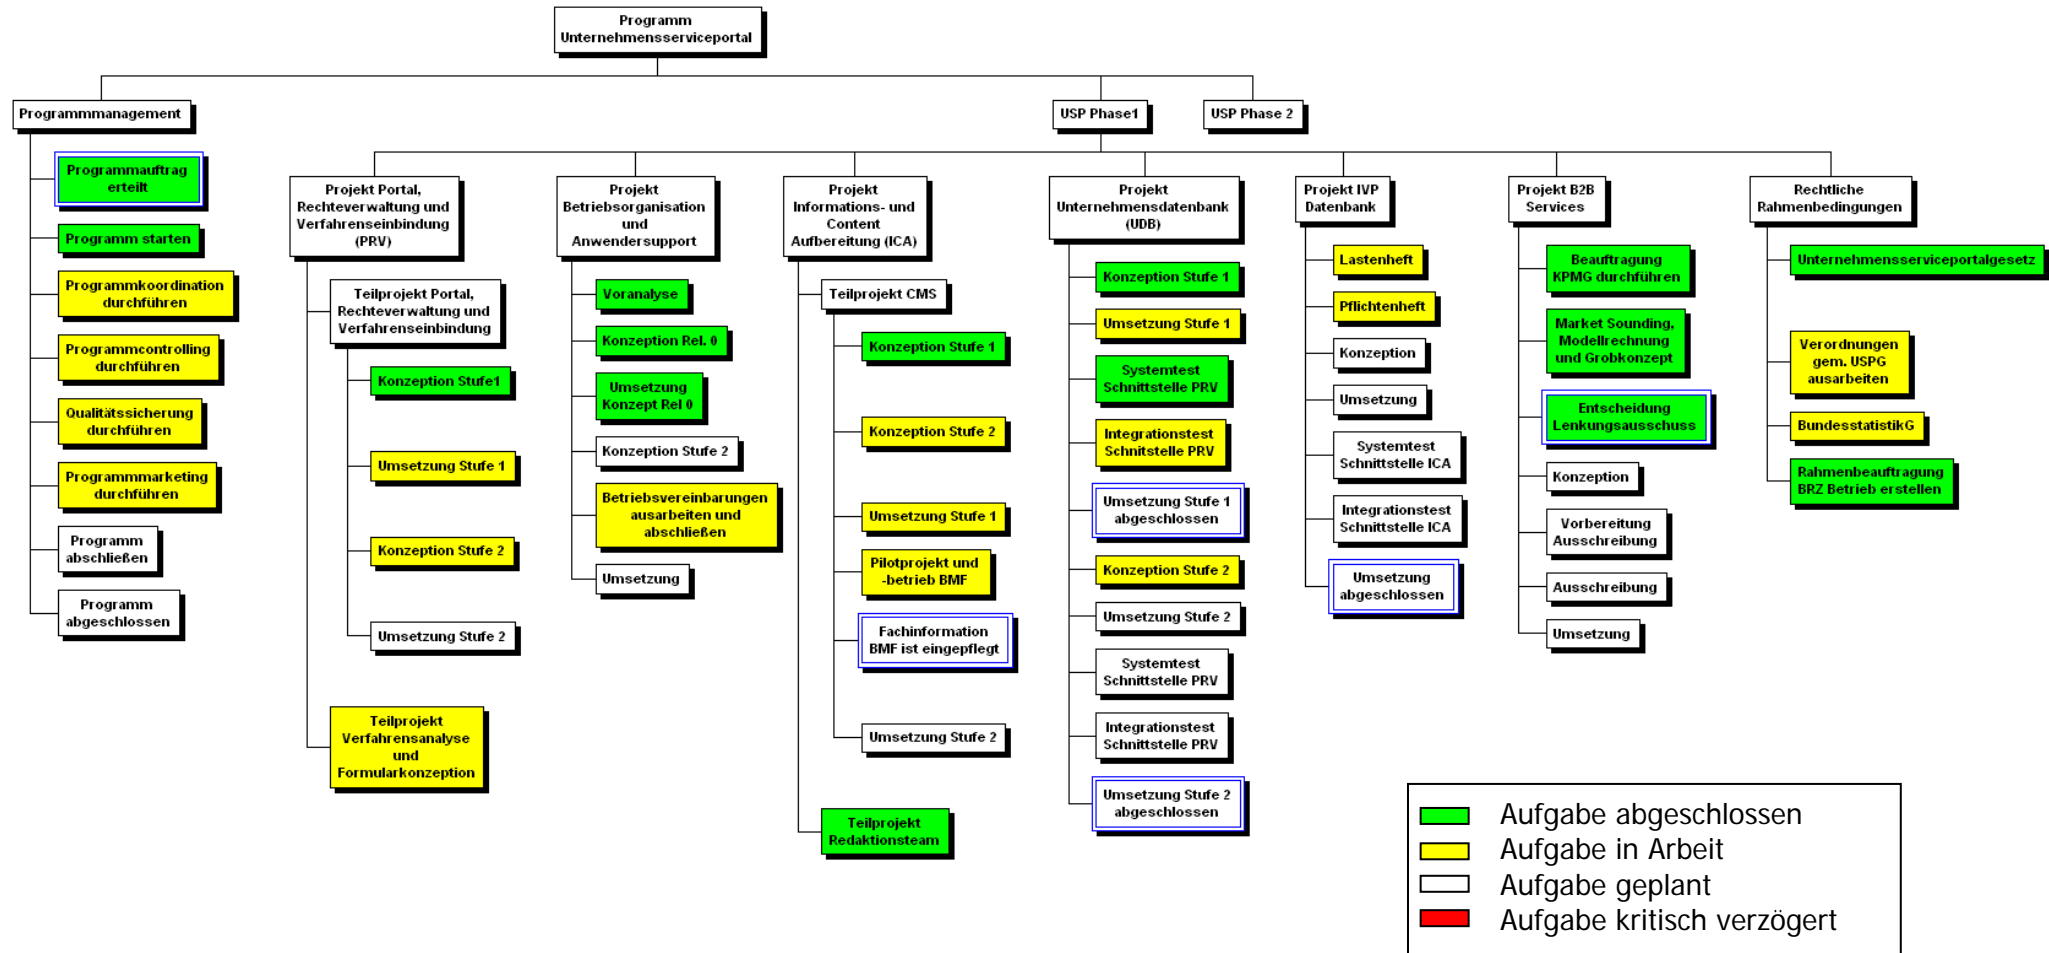

Ergebnisse seit dem letzten Statusbericht

Ergebnis	Termin
Lenkungsausschuss 4 - Präsentation WebDesign und Story Board - Präsentation Redaktionsprozess - Freigabe aktuelle Planung und Releaseinhalte (Stufe 1 u. 2) - Bericht zum Programmfortschritt	10.11.2009
Executive Board Meeting 2	10.11.2009
Freigabe Programmstatusbericht Q3/2009	18.12.2009
Erstfreigabe und Produktivstellung Projekt PRV und ICA	31.12.2009

Geplante Hauptaktivitäten für den nächsten Berichtszeitraum

Aktivität	Termin
Freigabe Programmhandbuch V1.2	26.01.2010
Rechtliche Rahmenbedingungen Verordnung gem. USPG, BundesstatistikG	01/2010
Datenübernahme und Ergänzung UDB Konzept um weitere Quellen	01/2010
Lenkungsausschuss 5 und Executive Board Meeting 3	19.02.2010
Implementierung Authentifizierung via FON	24.03.2010
Abschluss Implementierung und Freigabe Stufe 1	31.03.2010
Anforderungsanalyse inkl. Lastenhefterstellung Stufe 2	E03/2010

Aktuelle und neue Risiken und Risikomaßnahmen

Risikobeschreibung	Maßnahmen	Auswirkungen/ Schadenspotenzial

Meilensteinplanung

Meilenstein	Aktuelle Plan- termine	Ist Termine
Vorprogramm		
Programmauftrag erteilt (Ministerrat)		06.02.2009
Programmumsetzung beauftragt		29.04.2009
Konzeption Stufe 1		
Projekt ICA Konzeption Stufe 1 abgeschlossen		14.09.2009
Projekt UDB Konzeption Stufe 1 abgeschlossen		31.10.2009
Projekt PRV Konzeption Stufe 1 (Rel1) abgeschlossen		16.11.2009
Umsetzung Stufe 1		
Projekt UDB Umsetzung Stufe 1 abgeschlossen		31.12.2009
Projekt PRV Umsetzung Stufe 1 (Rel.1) abgeschlossen	31.03.2010	
Projekt ICA Umsetzung Stufe 1 abgeschlossen	31.03.2010	
Konzeption Stufe 2		
Projekt PRV Konzeption Stufe 2 (Rel. 2) abgeschlossen	19.02.2010	
Projekt ICA Konzeption Stufe 2 abgeschlossen	26.03.2010	
Projekt PRV Konzeption Stufe 2 (Rel. 3) abgeschlossen	11.06.2010	
Projekt UDB Konzeption Stufe 2 abgeschlossen	02.07.2010	
Projekt IVP Konzeption Stufe 2 abgeschlossen	01.10.2010	
Umsetzung Stufe 2		
Projekt PRV Umsetzung Stufe 2 (Rel.2) abgeschlossen	30.07.2010	
Projekt PRV Umsetzung Stufe 2 (Rel.3) abgeschlossen	31.12.2010	
Projekt ICA Umsetzung Stufe 2 abgeschlossen	31.12.2010	
Projekt UDB Umsetzung Stufe 2 abgeschlossen	31.12.2010	
Projekt IVP Umsetzung Stufe 2 abgeschlossen	31.12.2010	
